

Breitbandausbau im Landkreis Cloppenburg – Sachstand –

- 1. Breitbandausbau von Unternehmen in unterversorgten Gewerbegebieten und in Einzellagen**
- 2. Breitbandausbau von unterversorgten Haushalten und Schulen**
- 3. Geplantes kreisweites Förderprojekt**

1. Ausbauprojekt für Unternehmen

- **kreisweit:** kostenlose Glasfaseranschlüsse für 559 Unternehmen in 29 unterversorgten Gewerbegebieten und in gewerblicher Einzellage
- **Friesoythe:** 166 Unternehmen in folgenden Gewerbegebieten / Einzellagen:
 - Über dem Vehnteich
 - Böseler Straße/Blaue Straße
 - Wangerooger Straße
 - Friesoythe-West
 - Gewerbepark Nord
 - Im alten Haferland
 - Industriestraße
 - c-Port

1. Ausbauprojekt für Unternehmen

- Vertragliche Fertigstellung des Ausbauprojektes durch inexio/Komnexe: 31.12.2018
 - Termin wurde überschritten
- Gründe für die Verzögerungen (u.a.):
 - fehlende Tiefbaukapazitäten
 - Umplanung der Netzinfrastruktur an das Netz von EWE
 - Aufnahme zusätzlicher Adressen entlang der Trasse
 - witterungsbedingte Verzögerungen
- Landkreis hat Fachanwaltskanzlei mit der Prüfung rechtlicher Schritte beauftragt und von inexio/Komnexe einen verbindlichen Bauzeitenplan angefordert
- Kooperation mit EWE geplant:
 - Errichtung der passiven Infrastruktur: inexio/Komnexe
 - Errichtung der aktiven Technik: EWE


1. Ausbauprojekt für Unternehmen

Finanzierung:

- Wirtschaftlichkeitslücke Friesoythe: rd. 854.800,00 Euro
- LK und Städte und Gemeinden tragen jeweils 50%
- Eigenanteil Friesoythe: rd. 427.400,00 Euro
- Einsatz der Mittel Bundes aus dem Kommunalinvestitionsförderprogramm (KIP) zur Reduzierung des kommunalen Eigenanteils
- Die Finanzierung ist durch die eingetretenen Verzögerungen nicht gefährdet, da die Fördermittel bis zum 31.12.2020 zur Verfügung stehen.

2. Ausbauprojekt für Haushalte

- Kreisweit erhalten 4.710 Adressen in 92 Ausbaugebieten einen Breitbandanschluss, davon:
 - FTTB (Glasfaser): 2.040 Adressen
 - FTTC (VDSL): 2.670 Adressen
- Friesoythe:
 - 1.140 Adressen in 19 Ausbaugebieten, davon
 - FTTB (Glasfaser): 440 Adressen
 - FTTC (VDSL): 700 Adressen
- Ferner erhalten 63 Schulen im Kreisgebiet einen geförderten Glasfaseranschluss, davon
 - 13 Schulen in Friesoythe

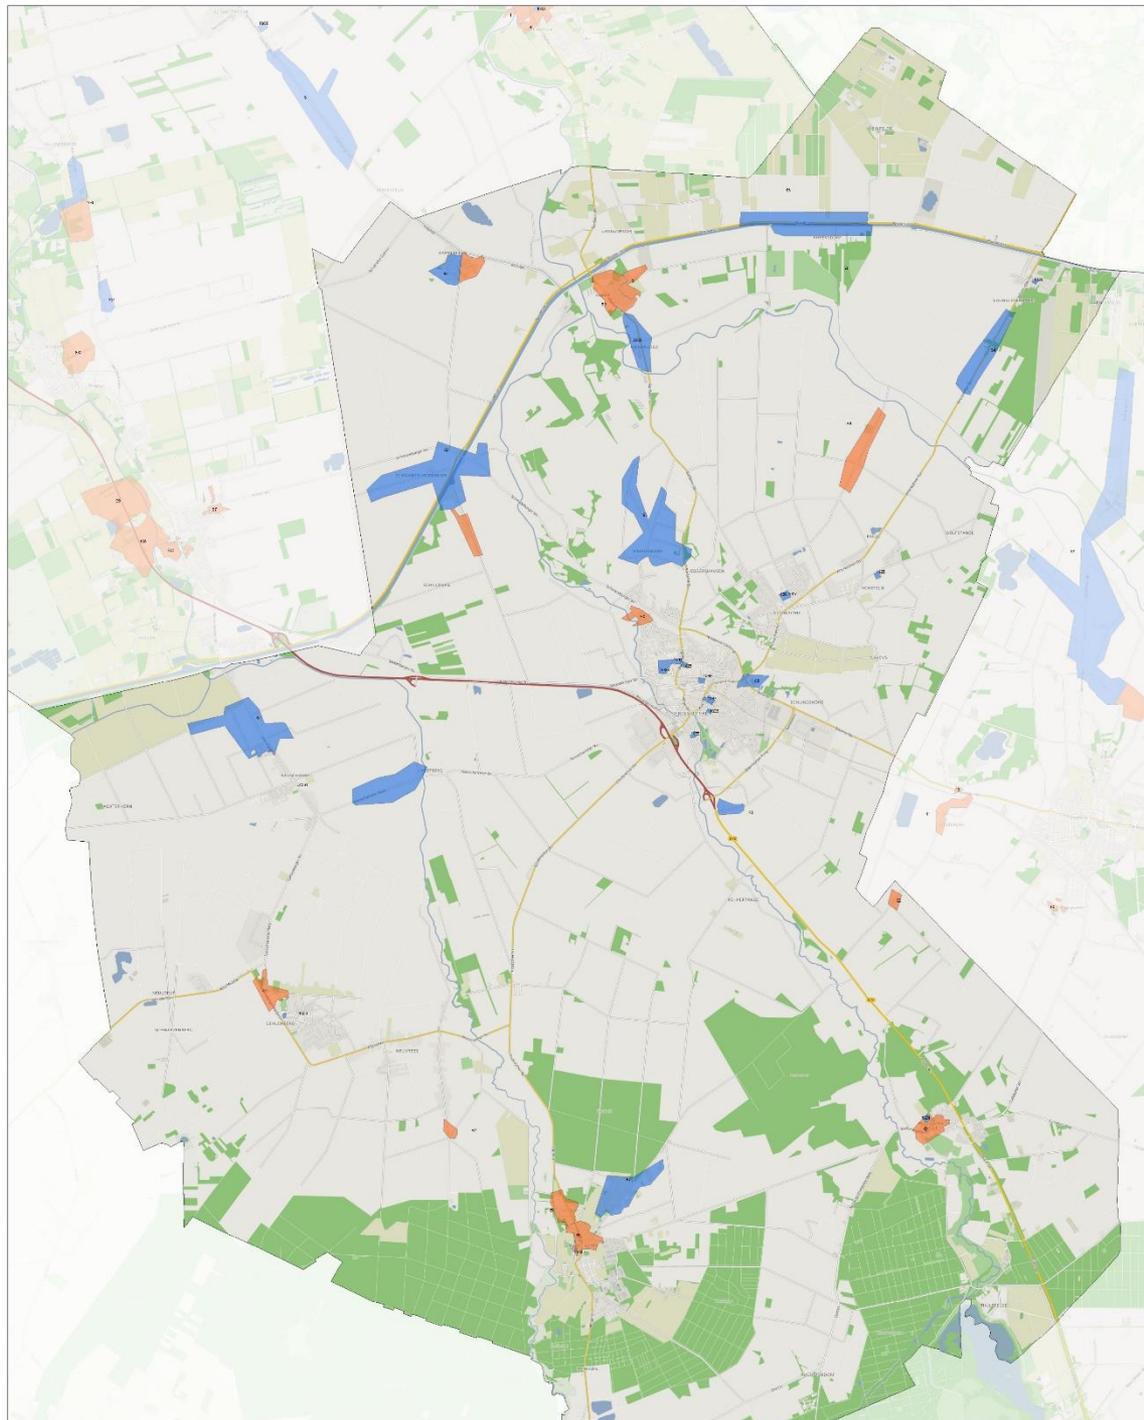

2. Ausbauprojekt für Haushalte

Finanzierung:

Haushalte:

Stadt/Gemeinde	Wirtschaftlichkeitslücke	Förderung Bund (50%)	Förderung Land (2 Mio. Euro)	verbleibender Eigenanteil	Eigenanteil LK 50%	Eigenanteil Stadt/Gemeinde 50%
Friesoythe	1.429.543,35	714.771,68	314.605,34	400.166,33	200.083,17	200.083,17

Schulen:

Stadt/Gemeinde	Wirtschaftlichkeitslücke	Förderung Bund 50%	Eigenanteil LK 25%	Eigenanteil Stadt/Gemeinde 25%
Friesoythe	125.172,38	62.586,19	31.293,10	31.293,10

3. Geplantes Ausbauprojekt

- Nach Abschluss der beiden aktuellen Ausbauprojekte verbleiben kreisweit rd. 7.000 unterversorgte Adressen.
 - Friesoythe: rd. 1.450 Adressen
 - Gewerbegebiet Pirgo
- Planung eines weiteres kreisweiten Ausbauprojekt mit Fördermitteln von Bund und Land
- Förderung Bund: 50% der Wirtschaftlichkeitslücke, max. 30 Mio. Euro
- Förderung Land (Entwurf): 25% der Wirtschaftlichkeitslücke, max.
 - 2.000 Euro für die ersten 2.000 Adressen
 - 1.500 Euro für die 2.001 bis 4.000sten Adresse
 - 500 Euro ab der 4.001ten Adresse

3. Geplantes Ausbauprojekt

- Aktuell finden Gespräche mit den Städten und Gemeinden zur Abstimmung der Gebietskulisse für das neue Förderprojekt statt
- Festlegung der Ausbaubereiche erfolgt **durch die Städte und Gemeinden** – auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte – auf der Grundlage von Wirtschaftlichkeitsberechnungen durch das Planungsbüro seim & partner
- Beantragung der Fördermittel bei Bund und Land vor der Sommerpause vorgesehen
- Start des europaweiten Ausschreibungsverfahrens im Sommer/Herbst 2018 (in Abhängigkeit der Zuwendungsbescheide)
- Dauer des europaweiten Ausschreibungsverfahrens 5-6 Monate
- Geplanter Ausbaustart in 2020

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
